ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΜΕ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ Η ΑΛΛΑ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΑ

Α/Α	ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ	ΔΙΑΡΚΕΙΑ
1	**1 ΣΤΑΔΙΟ Ι: Προκαταρκτικός Προγραμματισμός Έργου**	**4M**
2	1.1 Μελέτη Κοινωνικής και Πολιτικής Σκοπιμότητας	1M
3	1.2 Προκαταρκτικά Στοιχεία έργου	3M
4	1.2.1 Προσδιορισμός του Μεγέθους και των Λειτουργιών	1M
5	1.2.2 Χωροθέτηση του Έργου	3M
6	1.2.2.1 Εξεύρεση Χώρου	1.5M
7	1.2.2.2 Οικιστική Καταλληλότητα	1.5M
8	1.2.3 Προκαταρκτική Μελέτη Οικονομικής Εφικτότητας	1M
9	2 Εγκριση Προγράμματος Εκτέλεσης Έργου	1M
10	**3 ΣΤΑΔΙΟ ΙΙ: Προκαταρκτικές και Υποστηρικτικές Μελέτες**	**21M**
11	3.1 Διαδικασία Ανάθεσης και Επίβλεψης Μελέτης	6M
12	3.1.1 Διαδικασία Επιλογής Μελετητή	5M
13	3.1.1.1 Δημοσίευση Προκήρυξης Μελέτης	1.5M
14	3.1.1.2 Αξιολόγηση Υποψήφιων Μελετητών	0.5M
15	3.1.1.3 Επιλογή Μελετητή	0.5M
16	3.1.1.4 Κοινοποίηση Απόφασης Ανάθεσης	0.5M
17	3.1.1.5 Διαδικασία Ενστάσεων	1.5M
18	3.1.1.6 Ανάθεση Μελέτης	0.5M
19	3.1.2 Κατάρτιση και Υπογραφή Σύμβασης	1M
20	3.2 Επίβλεψη Μελέτης	14M
21	3.3 Εποπτεία Μελέτης	14M
22	3.4 Προκαταρκτικές και Υποστηρικτικές Μελέτες	4M
23	3.4.1 Εντολή Έναρξης Σταδίου ΙΙ	0M
24	3.4.2 Αναγνώριση Έργου - Συγκέντρωση Στοιχείων	1M
25	3.4.3 Εκπόνηση Προκαταρκτικής Μελέτης	1M
26	3.4.4 Εκπόνηση Υποστηρικτικών Μελετών	3M
27	3.4.4.1 Εκτέλεση Γεωτεχνικών Ερευνών	2M
28	3.4.4.2 Εκπόνηση Οικονομοτεχνικής Μελέτης	2M
29	3.4.4.3 Λοιπές Υποστηρικτικές Μελέτες	3M
30	3.5 Εκπόνηση Προμελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων - (Φ.Π.Χ.) ή/και Φακέλου Τροποποίησης Γεν. Πολ. Σχεδ	1M
31	3.6 Διαδικασίες Εκδοσης Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Αξιολόγησης και Εκτίμησης	3M
32	3.6.1 Παραλαβή Π.Π.Ε. (Φ.Π.Χ.) - Έλεγχος - Υποβολή	0.5M
33	3.6.2 Παραλαβή Π.Π.Ε. (Φ.Π.Χ.) - Γνωμοδοτήσεις Συναρμοδίων	2M
34	3.6.3 Έκδοση Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και Αξιολόγησης (Π.Χ.)	0.5M
35	3.7 Διαδικασία Τροποποίησης του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδιασμού	3M
36	4 Εγκριση Σταδίου ΙΙ	1M
37	**5 ΣΤΑΔΙΟ ΙΙΙ : Προμελέτες Μελέτες και Αδειοδοτήσεις**	**5M**
38	5.1 Εντολή Έναρξης Σταδίου ΙΙΙ	0M
39	5.2 Εκπόνηση Προμελέτών - Ποιοτικών Τεχνικών Προδιαγραφών - Οικονομικής Μελετης & Νομικού Πλαισίου	4M
40	5.3 Εκπόνηση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων-Μ.Π.Ε.	1M
41	5.4 Διαδικασίες Έκδοσης Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων	4M
42	5.4.1 Παραλαβή Μ.Π.Ε.-Έλεγχος-Υποβολή	0.5M
43	5.4.2 Παραλαβή της Μ.Π.Ε.-Έλεγχος-Διαβίβαση	0.5M
44	5.4.3 Παραλαβή της Μ.Π.Ε.-Γνωμοδότηση-Διαβίβαση	0.5M
45	5.4.4 Νομαρχιακό Συμβούλιο: Παραλαβή-Δημοσίευση Ανάρτηση Μ.Π.Ε.	0.5M
46	5.4.5 Διατύπωση Απόψεων - Αντιρρήσεων - Προτάσεων	0.5M
47	5.4.6 Νομαρχιακό Συμβούλιο: Κριτική Άποψη Διαβίβαση	0.5M
48	5.4.7 Σύνταξη Σχεδίου Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων	1M
49	5.4.8 Υπογραφή Υπουργών ή Γ.Γ. Περιφέρειας ή Νομαρχών	0.5M
50	5.4.9 Έκδοση Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων	0.5M
51	5.5 Σύνταξη Τευχών Δημοπράτησης	2M
52	6 Έγκριση Σταδίου ΙΙΙ (Παραλαβή - Έγκριση Προμελετών & Τευχών Δημοπράτησης)	1M

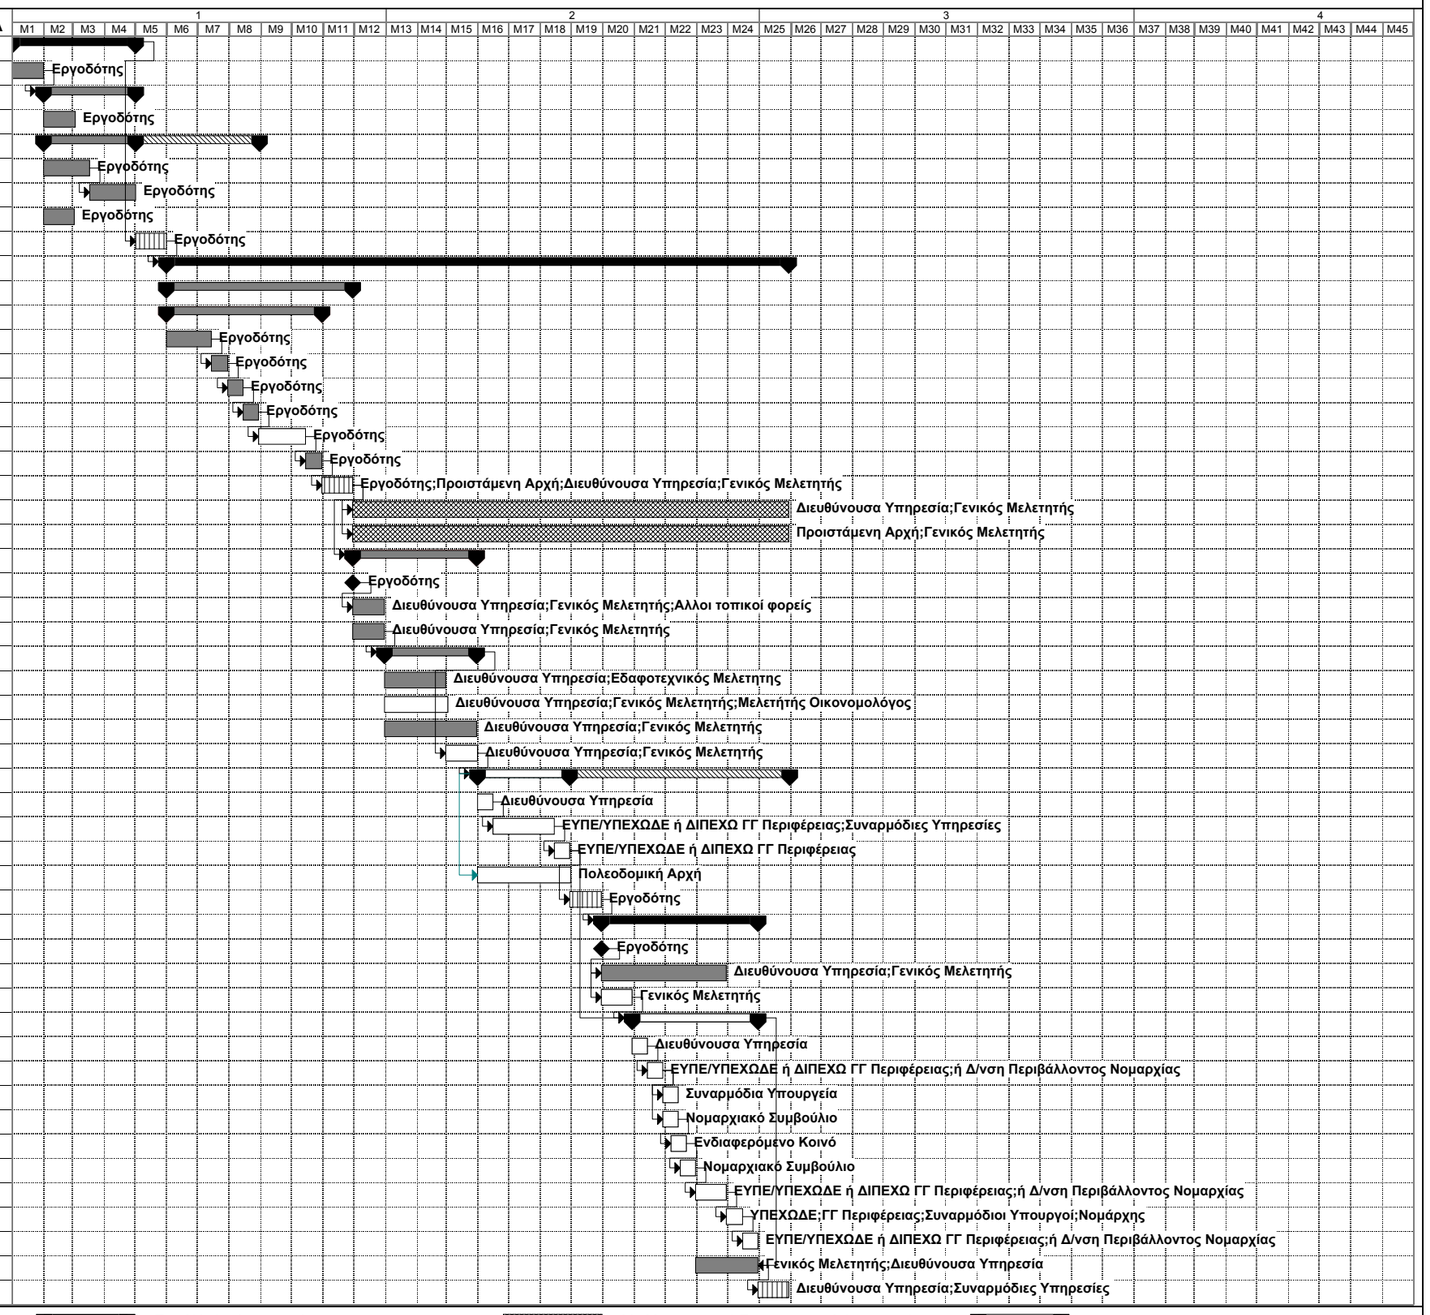

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Δραστηριότητα	Κύρια Δραστηριότητα	Παράλληλη Δραστηριότητα	Μη Υποχρεωτική Συγκεντρωτική Δραστηριότητα	
Ορόσημο	Μη Υποχρεωτική Δραστηριότητα	Πιθανή Παράταση Δραστηριότητας		
Συγκεντρωτική Δραστηριότητα	Έγκριση	Πιθανή Παράταση Συγκεντρωτικής Δραστηριότητας		

Κωδ. Αρ. Τεύχους:	ΩΔ-Α-1.0
Κατάστ. Εγγρ.:	Σχέδιο
Ημερομηνία:	20/08/2002
Έκδοση:	0
