ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ
(ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ)

Α/Α	ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ	ΔΙΑΡΚΕΙΑ
1	**1 Διαδικασία Επιλογής Μελετητή**	**6M**
2	1.1 Δημοσίευση Προκήρυξης Μελέτης	1.5M
3	1.2 Αξιολόγηση Υποψήφιων Μελετητών	1M
4	1.3 Επιλογή Μελετητή	0.5M
5	1.4 Κοινοποίηση Απόφασης Ανάθεσης	0.5M
6	1.5 Διαδικασία Ενστάσεων	2.5M
7	1.6 Ανάθεση Μελέτης	0M
8	2 Κατάρτιση Σύμβασης - Υπογραφή Σύμβασης - Εγκατάσταση Αναδόχου	1M
9	3 Επίβλεψη Μελέτης	30M
10	4 Εποπτεία Μελέτης	30M
11	**5 ΣΤΑΔΙΟ Ι: Αναγνωριστική μελέτη έργου / Προμελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων**	**7M**
12	5.1 Κυκλοφοριακή μελέτη / Θέσεις κόμβων	2M
13	5.2 Αναγνώριση Έργου	4.5M
14	5.2.1 Αναγνώριση Έργου - Συγκέντρωση Στοιχείων	1M
15	5.2.2 Πρόγραμμα Τοπογραφικών Εργασίων	1M
16	5.2.3 Έγκριση Προγράμματος Τοπογραφικών Εργασίων	0.5M
17	5.2.4 Εκπόνηση Προκαταρκτικών Εργασιών	2M
18	5.3 Γεωλογική Αναγνώριση	2M
19	5.4 Εκπόνηση Οικονομοτεχνικής Μελέτης	2M
20	5.5 Εκπόνηση Προμελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Φ.Π.Χ. ή Απαλλαγή) - Υποβολή	2.5M ή 1/6M
21	5.6 Έγκριση Προμελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων - Π.Π.Ε. (Π.Χ.)	**1M**
22	5.6.1 Παραλαβή Π.Π.Ε. (Φ.Π.Χ.) - Έλεγχος - Υποβολή	0.25M
23	5.6.2 Παραλαβή Π.Π.Ε. (Φ.Π.Χ.) - Γνωμοδοτήσεις Συναρμοδιών	0.5M
24	5.6.3 Έκδοση Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και Αξιολόγησης (Π. Χ.)	0.25M
25	6 Έγκριση Σταδίου Ι	1M
26	**7 ΣΤΑΔΙΟ ΙΙ: Προμελέτες Έργων / ΜΠΕ**	**11M**
27	7.1 Εντολή Έναρξης Σταδίου ΙΙ	0M
28	7.2 Εκτέλεση Τοπογραφικών Εργασιών	2.5M
29	7.3 Προμελέτη Κυκλοφοριακού Έργου	4.5M
30	7.4 Προμελέτη Αποχέτευσης - Αποστράγγισης	3M
31	7.5 Οριστική Γεωλογική Μελέτη	3M
32	7.6 Πρόγραμμα Γεωτεχνικών και Λοιπών Ερευνών	1M
33	7.7 Προκαταρκτική Μελέτη Κόμβων και Παράπλευρων Έργων	3M
34	7.8 Προκαταρκτική Επεξεργασία Τεχνικών Έργων	3M
35	7.9 Εκπόνηση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων	3M
36	7.10 Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων-Μ.Π.Ε.	4.5M
37	7.10.1 Παραλάβή Μ.Π.Ε.- Έλεγχος-Υποβολή	0.5M
38	7.10.2 Παραλαβή Μ.Π.Ε.-Έλεγχος-Διαβίβαση	0.5M
39	7.10.3 Παραλαβή Μ.Π.Ε.-Γνωμοδότηση-Διαβίβαση	0.5M
40	7.10.4 Νομαρχιακό Συμβούλιο: Παραλαβή-Δημοσίευση Ανάρτηση ΜΠΕ	0.5M
41	7.10.5 Διατύπωση Απόψεων - Αντιρρήσεων - Προτάσεων	0.5M
42	7.10.6 Νομαρχιακό Συμβούλιο: Κριτική Άποψη Διαβίβαση	0.5M
43	7.10.7 Σύνταξη Σχεδίου Απόφασης Έγκρισης περιβαλλοντικών όρων	1M
44	7.10.8 Υπογραφή Υπουργών η Γ.Γ. Περιφέρειας	0.5M
45	7.10.9 Έκδοση Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων	0.5M
46	8 Έγκριση Σταδίου ΙΙ	1M
47	**9 ΣΤΑΔΙΟ ΙΙΙ: Οριστικές Μελέτες Έργων**	**6M**
48	9.1 Εντολή Εναρξης Σταδίου ΙΙΙ	0M
49	9.2 Οριστική Μελέτη Κυκλοφοριακού Έργου	6M
50	9.3 Οριστική Μελέτη Αποχέτευσης - Αποστράγγισης	4M
51	9.4 Εκτέλεση Γεωτεχνικών και Λοιπών Ερευνών	4M
52	9.5 Μελέτη Σήμανσης/ Ασφάλισης	4M
53	9.6 Εξοπλισμός Οδού	4M
54	9.7 Προμελέτη Κόμβων και Παράπλευρων Έργων	4M
55	9.8 Γεωτεχνικά Τεχνικών Έργων	4M
56	9.9 Προμελέτη Τεχνικών Εργών	4M
57	10 Εγκριση Σταδίου ΙΙΙ	1M
58	**11 ΣΤΑΔΙΟ IV: Οριστικές Μελέτες Λοιπών Έργων**	**2M**
59	11.1 Εντολή Εναρξης Σταδίου IV	0M
60	11.2 Οριστική Μελέτη Κόμβων και Παράπλευρων Έργων	3M
61	11.3 Οριστική Μελέτη Τεχνικών Έργων	3M
62	12 Εγκριση Σταδίου IV	1M
63	**13 ΣΤΑΔΙΟ V: Λοιπές Μελέτες**	**6M**
64	13.1 Κτηματολόγιο	4M
65	13.2 Μελέτες Εφαρμογής	3M
66	14 Εγκριση Σταδίου V	1M
67	15 Απαλλοτριώσεις	7M
68	16 Σύνταξη Τευχών Δημοπράτησης	2M

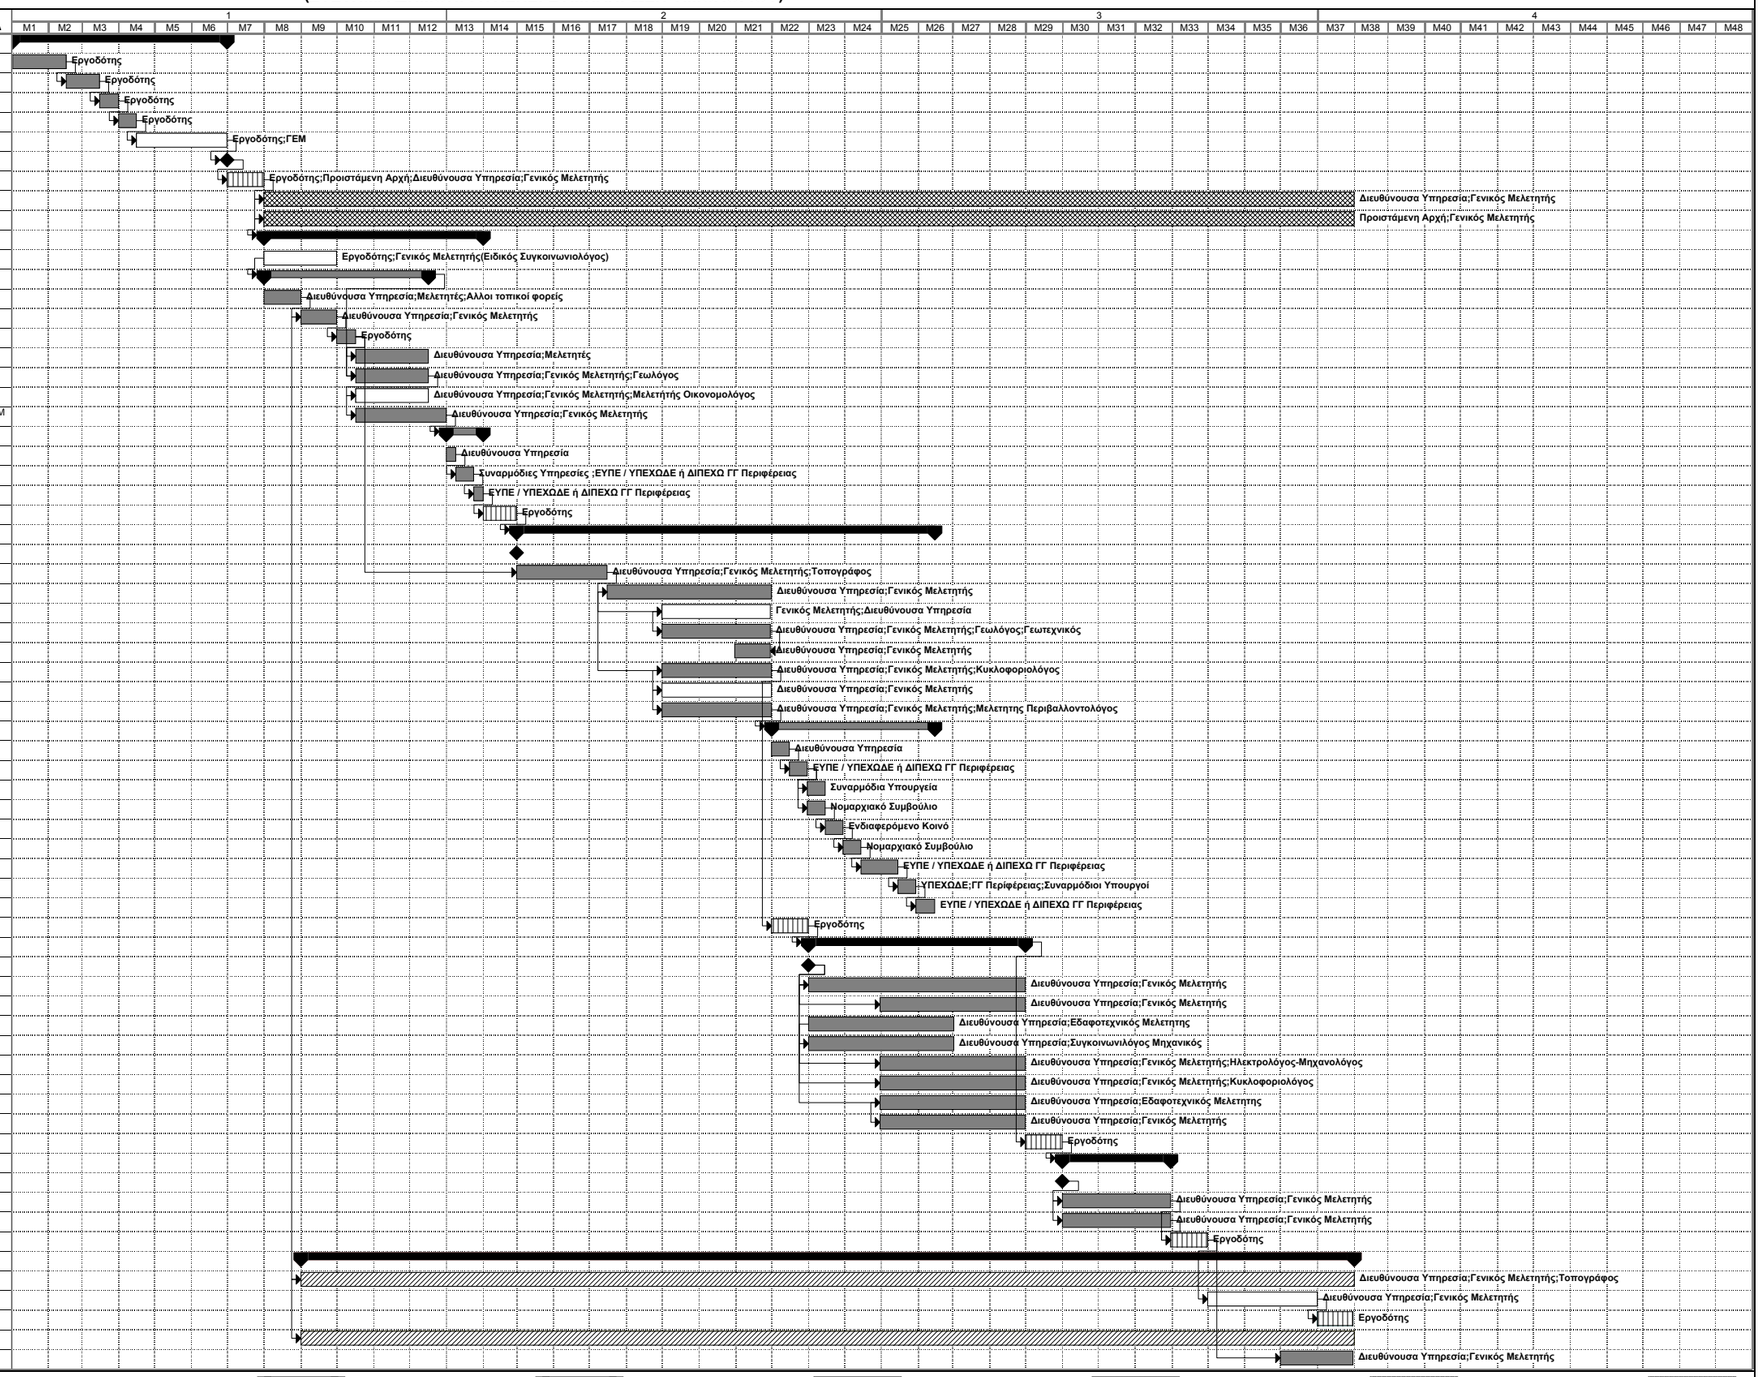

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Δραστηριότητα | Ορόσημο | Συγκεντρωτική Δραστηριότητα | Κύρια Δραστηριότητα | Μη Υποχρεωτική Δραστηριότητα | Έγκριση | Παράλληλη Δραστηριότητα | Μερικώς Εξελισσόμενη Δραστηριότητα

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: **Κ/ΞΙΑ ΝΑΜΑ - MARNET - ΣΑΛΦΩ**
ΥΡΕΤΗΟ/ΕΡ8/c-WD-PA.0

Κωδ. Αρ. Τεύχους:	ΟΔ-Α-1.0
Κατάστ. Εγγρ.:	Σχέδιο
Ημερομηνία:	20/08/2002
Έκδοση:	0
