ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΝΕΡΟΥ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ
(ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ)

Α/Α	ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ	Διάρκεια
1	**1 Μελέτες Γενικού σχεδιασμού - Εκθέσεις για την Τεκμηρίωση Αναγκαιότητας του Έργου**	**2M**
2	**2 Διαδικασία Επιλογής Μελετητή**	**5M**
3	2.1 Δημοσίευση Προκήρυξης Μελέτης	1.5M
4	2.2 Αξιολόγηση Υποψήφιων μελετητών	1M
5	2.3 Επιλογή Μελετητή	0.5M
6	2.4 Κοινοποίηση Απόφασης Ανάθεσης	0.5M
7	2.5 Διαδικασία Ενστάσεων	1.5M
8	2.6 Ανάθεση Μελέτης	0M
9	3 Κατάρτιση Σύμβασης - Υπογραφή Σύμβασης - Εγκατάσταση Αναδόχου	1M
10	4 Επίβλεψη Μελέτης	22M
11	5 Εποπτεία Μελέτης	22M
12	**6 ΣΤΑΔΙΟ Ι: Προκαταρκτική Μελέτη Έργου / Π.Π.Ε**	**6M**
13	6.1 Μέτρηση Παροχών - Έλεγχος Καταλληλότητας Νερού	6M
14	6.2 Προκαταρκτική μελέτη	4M
15	6.3 Υδρολογική Μελέτη	2M
16	6.4 Γεωλογική Αναγνώριση	1M
17	6.5 Εκπόνηση Προμελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων -Π.Π.Ε. (Φ.Π.Χ.) - Υποβολή	1M
18	6.6 Διαδικασία Έκδοσης Απόφασης Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και Αξιολόγησης (Π.Χ.)	1M
19	6.6.1 Παραλαβή Π.Π.Ε (Φ.Π.Χ.) - Έλεγχος - Υποβολή	0.25M
20	6.6.2 Παραλαβή Π.Π.Ε.(Φ.Π.Χ.) - Γνωμοδοτήσεις Συναρμοδιών	0.5M
21	6.6.3 Έκδοση Απόφασης Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και Αξιολόγησης (Π.Χ.)	0.25M
22	7 Έγκριση Σταδίου Ι	1M
23	**8 ΣΤΑΔΙΟ ΙΙ: Προμελέτη Έργου**	**3M**
24	8.1 Μελέτες Υποστήριξης	2M
25	8.1.1 Υδρολογική	2M
26	8.1.2 Γεωλογική	2M
27	8.1.3 Τοπογραφική	2M
28	8.1.4 Μέτρηση Παροχών -Έλεγχος Καταλληλότητας Νερού	3M
29	8.2 Προμελέτη(Γενική Διάταξη Έργου - Ειδικά Τεχνικά Έργα)	3M
30	8.3 Οικονομοτεχνική Μελέτη και Αξιολόγηση	1M
31	9 Έγκριση Σταδίου ΙΙ	1M
32	10 Γεωλογικές και Γεωτεχνικές Έρευνες	6M
33	**11 ΣΤΑΔΙΟ ΙΙΙ: Οριστική Μελέτη Έργου / Μ.Π.Ε**	**2M**
34	11.1 Μελέτες Υποστήριξης	2M
35	11.1.1 Γεωτεχνική Μελέτη	2M
36	11.1.2 Τοπογραφική μελέτη	2M
37	11.2 Οριστική Μελέτη	4M
38	11.3 Εκπόνηση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων	3M
39	11.4 Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων	4M
40	11.4.1 Παραλάβή ΜΠΕ-Έλεγχος-Υποβολή	0.5M
41	11.4.2 Παραλαβή της ΜΠΕ-Έλεγχος-Διαβίβαση	0.5M
42	11.4.3 Παραλαβή της ΜΠΕ-Γνωμοδότηση-Διαβίβαση	0.5M
43	11.4.4 Νομαρχιακό Συμβούλιο: Παραλαβή-Δημοσίευση Ανάρτηση ΜΠΕ	0.5M
44	11.4.5 Διατύπωση Απόψεων - Αντιρρήσεων - Προτάσεων	0.5M
45	11.4.6 Νομαρχιακό Συμβούλιο: Κριτική Άποψη Διαβίβαση	0.5M
46	11.4.7 Σύνταξη Σχεδίου Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων	1M
47	11.4.8 Υπογραφή Υπουργών ή Γ.Γ. Περιφέρειας	0.5M
48	11.4.9 Έκδοση Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων	0.5M
49	11.5 Έγκριση Σταδίου ΙΙΙ	1M
50	**12 ΣΤΑΔΙΟ IV: Λοιπές Ενέργειες**	**16M**
51	12.1 Κτηματολόγιο	10M
52	12.2 Απαλλοτριώσεις	3M
53	12.3 Σύνταξη και Έγκριση Τευχών Δημοπράτησης	3M

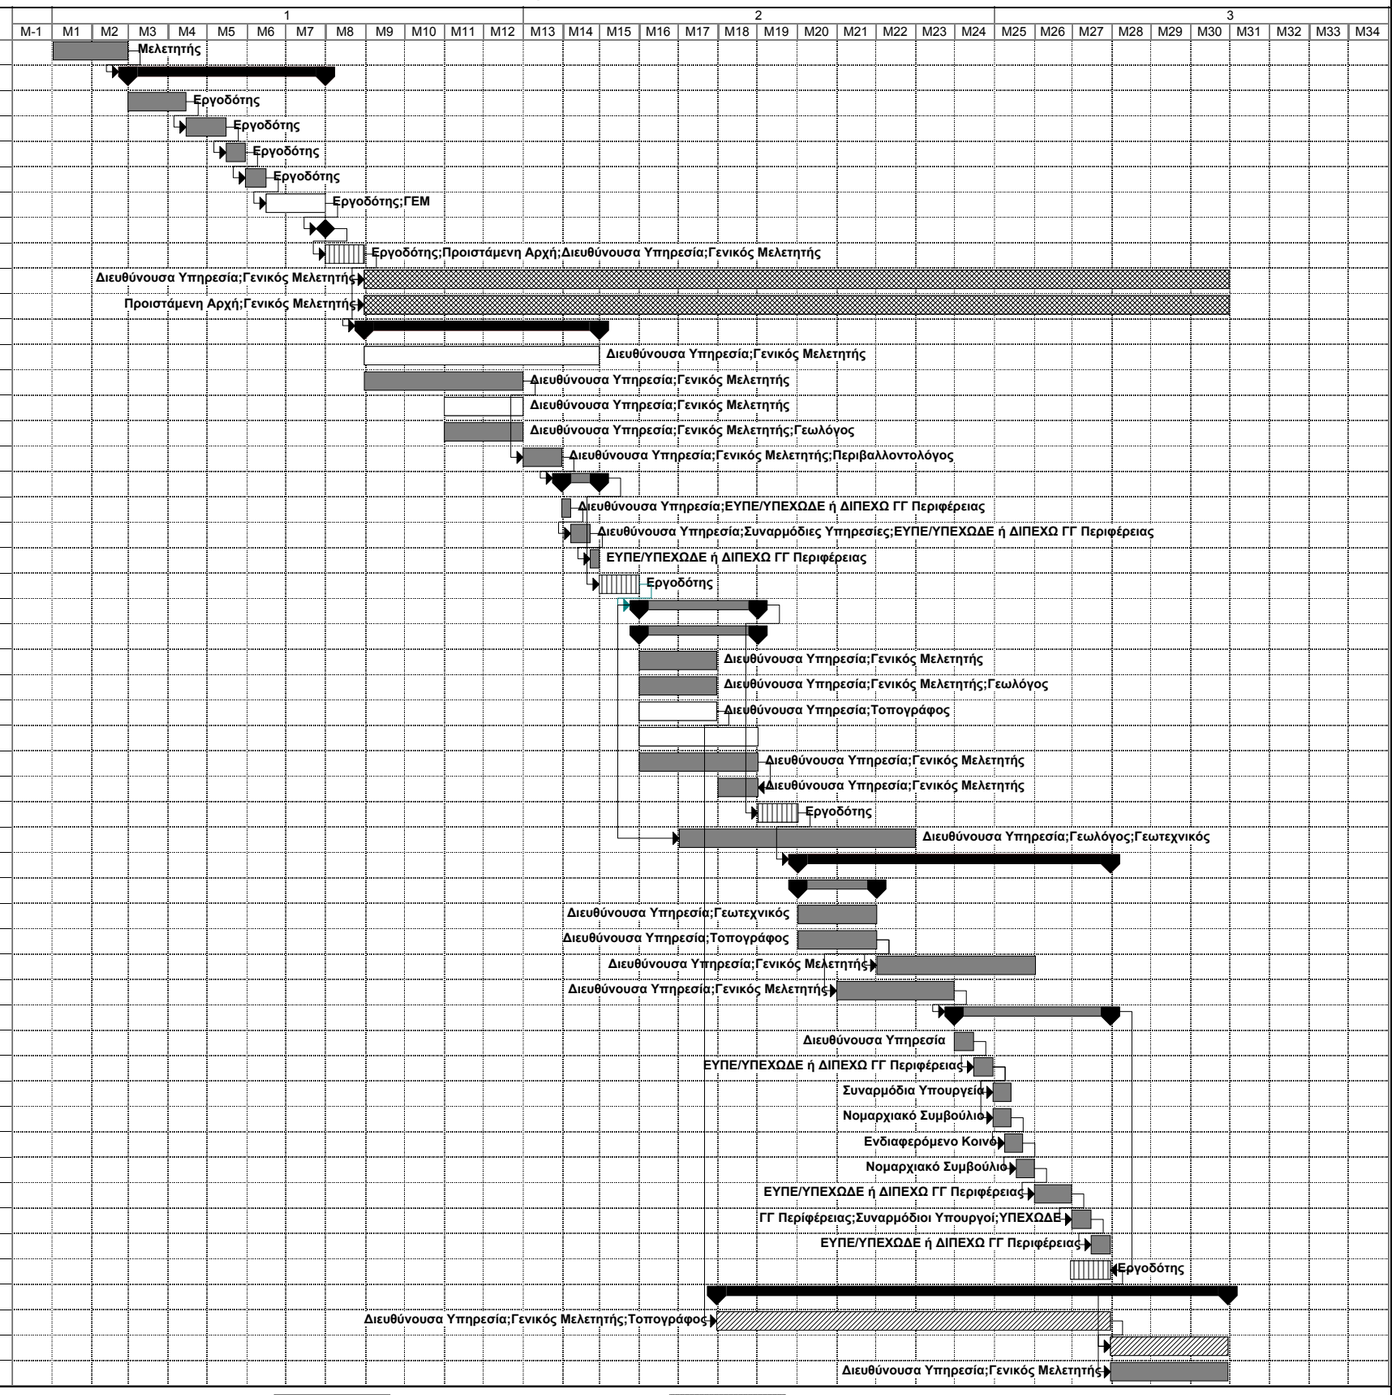

ΥΠΟΜΝΗΜΑ							
	Δραστηριότητα	Συγκεντρωτική Δραστηριότητα	Μη Υποχρεωτική Δραστηριότητα	Παράλληλη Δραστηριότητα
	Ορόσημο	Κύρια Δραστηριότητα	Έγκριση	Μερικώς Εξελισσόμενη Δραστηριότητα

Κωδ. Αρ. Τεύχους:	ΩΔ-Α-1.0
Κατάστ. Εγγρ.:	Σχέδιο
Ημερομηνία:	20/08/2002
Έκδοση:	0
