ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
(ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ: ΜΕΛΕΤΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ)

Α/Α	ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ	ΔΙΑΡΚΕΙΑ	Φάσεις
1	**1 Μελέτη Γενικού Σχεδιασμού**	**ΟΜ**	ΥΕΝ
2	**2 Διαδικασία Επιλογής Μελετητή**	**6Μ**	
3	2.1 Δημοσίευση Προκήρυξης Μελέτης	1.5Μ	Εργοδότης
4	2.2 Αξιολόγηση Υποψήφιων Μελετητών	0.5Μ	Εργοδότης
5	2.3 Επιλογή Μελετητή	0.5Μ	Εργοδότης
6	2.4 Κοινοποίηση Απόφασης Ανάθεσης	0.5Μ	Εργοδότης
7	2.5 Διαδικασία Ενστάσεων	2.5Μ	Εργοδότης
8	2.6 Ανάθεση Μελέτης	0.5Μ	Εργοδότης
9	3 Κατάρτιση και Υπογραφή Σύμβασης	1Μ	Εργοδότης;Προιστ. Αρχή;Διευθ. Υπηρεσία;Γεν. Μελετητής
10	4 Επίβλεψη Μελέτης	21Μ	Διευθ. Υπηρεσία;Γεν. Μελετητής
11	5 Εποπτεία Μελέτης	21Μ	Προιστ. Αρχή;Γεν. Μελετητής
12	**6 ΣΤΑΔΙΟ Ι**	**8Μ**	
13	6.1 Εντολή Έναρξης Σταδίου Ι	0Μ	Εργοδότης
14	6.2 Αναγνώριση Έργου - Συγκέντρωση Στοιχείων	1Μ	Διευθ. Υπηρεσία;Γεν. Μελετητής;Αλλοι τοπικοί φορείς
15	6.3 Μελέτη Σκοπιμότητας	1Μ	Γεν. Μελετητής
16	6.4 Έγκριση Μελέτης Σκοπιμότητας	1Μ	Διευθ. Υπηρεσία
17	6.5 Πρόγραμμα Τοπογρ. - Βυθομετρ. Εργασιών	1Μ	Διευθ. Υπηρεσία;Γεν. Μελετητής
18	6.6 Έγκριση Προγράμματος Τοπογρ. - Βυθομετρ. Εργασίων	1Μ	Εργοδότης
19	6.7 Εκτέλεση Τοπογρ. - Βυθομετρ. Εργασιών	1Μ	Διευθ. Υπηρεσία;Γεν. Μελετητής;Τοπογράφος
20	6.8 Εκπόνηση Προκαταρκτικών Μελέτών	3Μ	Διευθ. Υπηρεσία;Γεν. Μελετητής
21	6.9 Πρόγραμμα Γεωτεχνικών Ερευνών	1Μ	Διευθ. Υπηρεσία;Γεν. Μελετητής
22	6.10 Πρόγραμμα Εργαστηριακών Δοκιμών	1Μ	Γεν. Μελετητής;Διευθ. Υπηρεσία
23	6.11 Εκπόνηση Προμελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων-Π.Π.Ε. (Π.Χ.)	1Μ	Διευθ. Υπηρεσία;Γεν. Μελετητής
24	6.12 Διαδικασίες Εκδοσης Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και Αξιολόγησης (Π.Χ.)	3Μ	
25	6.12.1 Παραλαβή Π.Π.Ε (Φ.Π.Χ.) - Έλεγχος - Υποβολή	0.5Μ	Διευθ. Υπηρεσία
26	6.12.2 Παραλαβή Π.Π.Ε. (Φ.Π.Χ.) - Γνωμοδοτήσεις Συναρμοδιών	2Μ	Συναρμόδιες Υπηρεσίες ;ΕΥΠΕ/ΥΠΕΧΩΔΕ ή ΔΙΠΕΧΩ ΓΓ Περιφέρειας
27	6.12.3 Έκδοση Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και Αξιολόγησης (Φ. Π. Χ.)	0.5Μ	ΕΥΠΕ/ΥΠΕΧΩΔΕ ή ΔΙΠΕΧΩ ΓΓ Περιφέρειας
28	7 Εγκριση Σταδίου Ι	1Μ	Εργοδότης
29	8 Εγκριση Εργαστηριακών Δοκιμών (Ομοιώματος)	1Μ	Διευθ. Υπηρεσία;Ειδικό Εργαστήριο;Γεν. Μελετητής
30	9 Εκτέλεση Γεωτεχνικών Ερευνών	2Μ	Διευθ. Υπηρεσία;Εδαφοτεχνικός Μελετητης
31	10 Καθορισμός Αιγιαλού & Παραλίας - Παραχώρηση Χρήσης	20Μ	
32	10.1 Καθορισμός Γραμμής Αιγιαλού και Παραλίας	4Μ	Επιτροπή καθορισμού της Γραμμής Αιγιαλού & Παραλίας
33	10.2 Παραχώρηση Απλής Χρήσης Αιγιαλού και Παραλίας προς Εκτέλεση Έργων	4Μ	Κύριος του Έργου;ΔΤΥΝΑ;Κτηματική Υπηρεσία του Νομού;Συγνωμοδοτούσες Υπηρεσίες
34	**11 ΣΤΑΔΙΟ ΙΙ**	**7Μ**	
35	11.1 Εντολή έναρξης Σταδίου ΙΙ	0Μ	Εργοδότης
36	11.2 Εκπόνηση Προμελέτών	3Μ	Διευθ. Υπηρεσία;Γεν. Μελετητής
37	11.3 Εκπόνηση Οικονομοτεχνικής Μελέτης	2Μ	Διευθ. Υπηρεσία;Γεν. Μελετητής;Μελετήτής Οικονομολόγος
38	11.4 Εκτέλεση Εργαστηριακών Δοκιμών	2Μ	Διευθ. Υπηρεσία;Μελετητές
39	11.5 Εκπόνηση ΜΠΕ	2Μ	Διευθ. Υπηρεσία;Γεν. Μελετητής;Μελετητης Περιβαλλοντολόγος
40	11.6 Διαδικασίες Έκδοσης Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων	4Μ	
41	11.6.1 Παραλάβή ΜΠΕ-΄Ελεγχος-Υποβολή	0.5Μ	Διευθ. Υπηρεσία
42	11.6.2 Παραλαβή της ΜΠΕ-Έλεγχος-Διαβίβαση	0.5Μ	ΕΥΠΕ/ΥΠΕΧΩΔΕ ή ΔΙΠΕΧΩ ΓΓ Περιφέρειας
43	11.6.3 Παραλαβή της ΜΠΕ-Γνωμοδότηση-Διαβίβαση	0.5Μ	Συναρμόδια Υπουργεία
44	11.6.4 Νομαρχιακό Συμβούλιο: Παραλαβή-Δημοσίευση Ανάρτηση ΜΠΕ	0.5Μ	Νομαρχιακό Συμβούλιο
45	11.6.5 Διατύπωση Απόψεων - Αντιρρήσεων - Προτάσεων	0.5Μ	Ενδιαφερόμενο Κοινό
46	11.6.6 Νομαρχιακό Συμβούλιο: Κριτική Άποψη Διαβίβαση	0.5Μ	Νομαρχιακό Συμβούλιο
47	11.6.7 Σύνταξη Σχεδίου Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών όρων	1Μ	ΕΥΠΕ/ΥΠΕΧΩΔΕ ή ΔΙΠΕΧΩ ΓΓ Περιφέρειας
48	11.6.8 Υπογραφή Υπουργών η Γ.Γ. Περιφέρειας	0.5Μ	ΥΠΕΧΩΔΕ;ΓΓ Περίφέρειας;ΥΕΝ;Συναρμόδιοι Υπουργοί
49	11.6.9 Έκδοση Απόφασης ΄Εγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων	0.5Μ	ΕΥΠΕ/ΥΠΕΧΩΔΕ ή ΔΙΠΕΧΩ ΓΓ Περιφέρειας
50	12 Έγκριση Σταδίου ΙΙ	1Μ	Εργοδότης
51	**13 ΣΤΑΔΙΟ ΙΙΙ**	**2Μ**	
52	13.1 Εντολή Έναρξης Σταδίου ΙΙΙ	0Μ	Εργοδότης
53	13.2 Σύνταξη Τευχών Δημοπράτησης	2Μ	Διευθ. Υπηρεσία;Γεν. Μελετητής
54	14 Έγκριση Σταδίου ΙΙΙ (Τευχών Δημοπράτησης)	1Μ	Εργοδότης

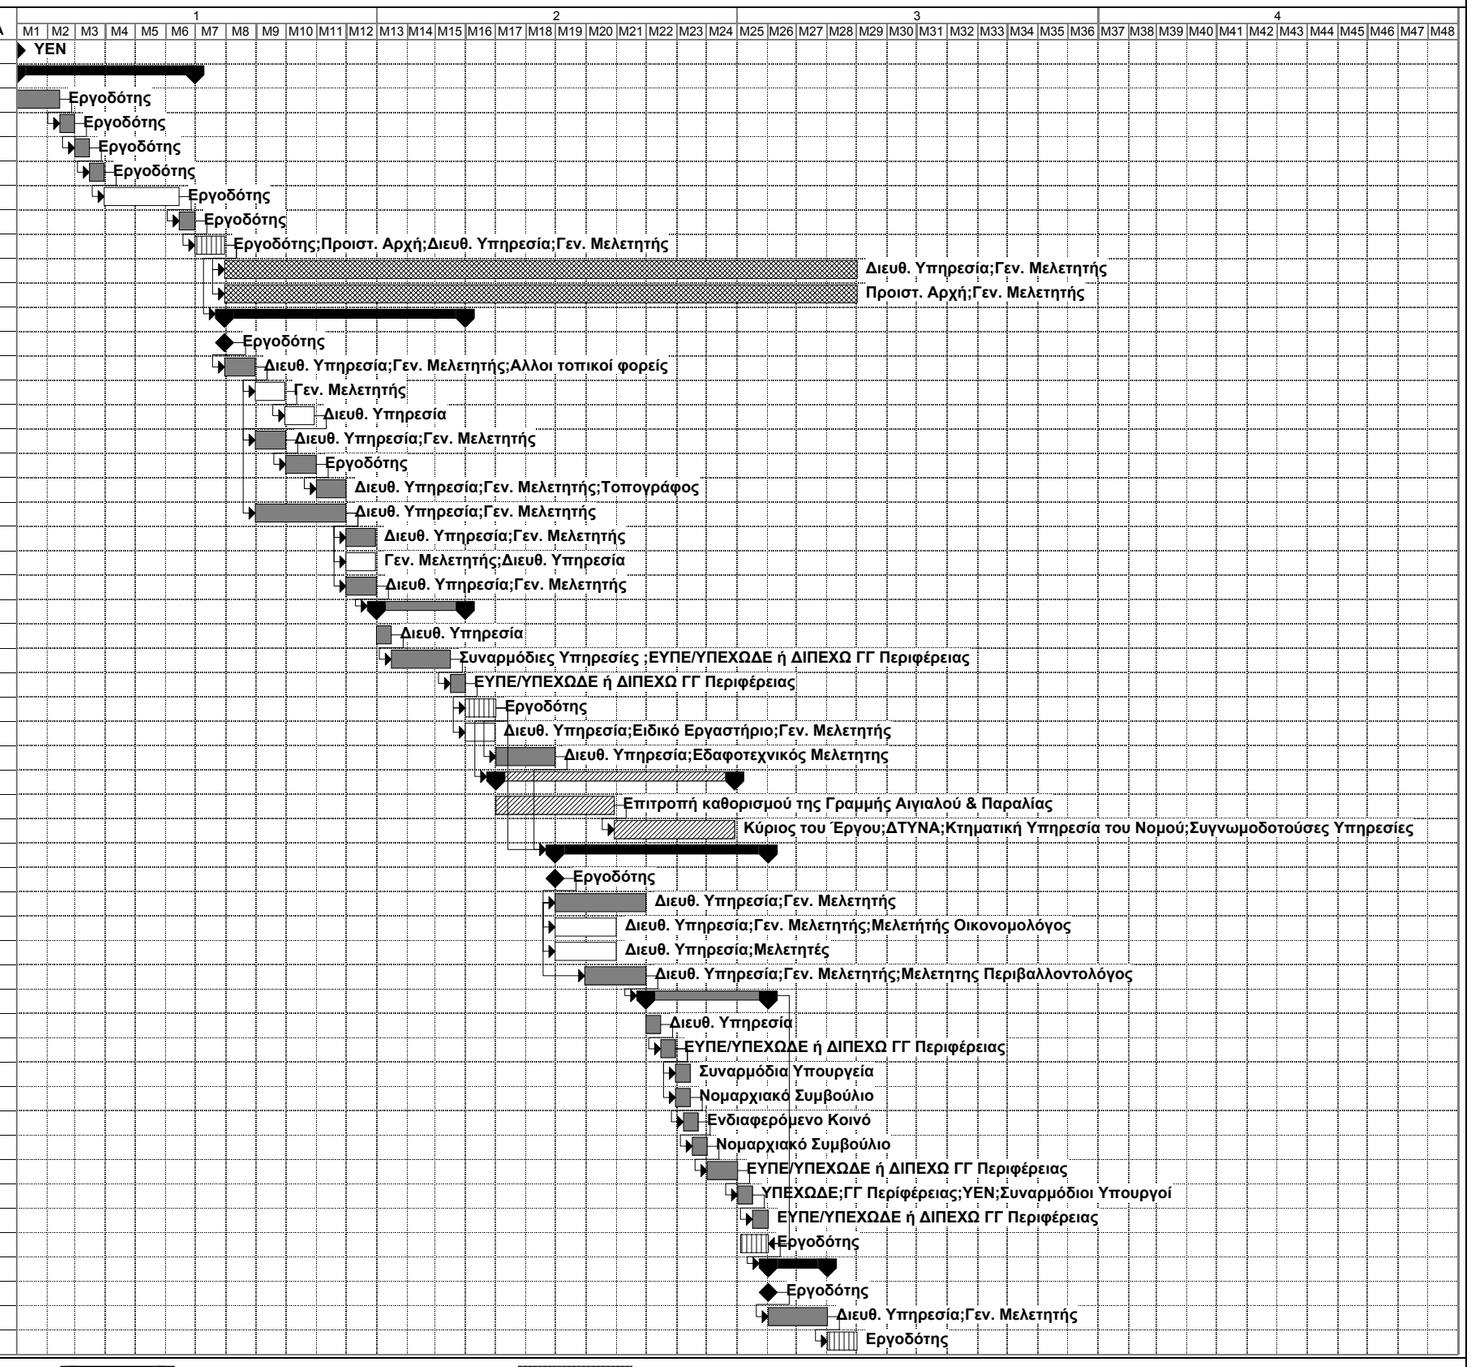

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Δραστηριότητα	Κύρια Δραστηριότητα	Παράλληλη Δραστηριότητα	
Ορόσημο	Μη Υποχρεωτική Δραστηριότητα	Μερικώς εξελισσόμενη Δραστηριότητα	
Συγκεντρωτική Δραστηρίότητα	Έγκριση	Μερικώς εξελισσόμενη Κύρια Δραστηριότητα	

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: **Κ/ΞΙΑ ΝΑΜΑ - MARNET - ΣΑΛΦΩ**
ΥΡΕΤΗΟ/ΕΡ8/c-WD-PA.1

Κωδ. Αρ. Τεύχους:	ΩΔ-Α-1.1
Κατάστ. Εγγρ.:	Σχέδιο
Ημερομηνία:	10/2003
Έκδοση:	1
